


# 附件1 公共工程施工進度管理作業流程圖

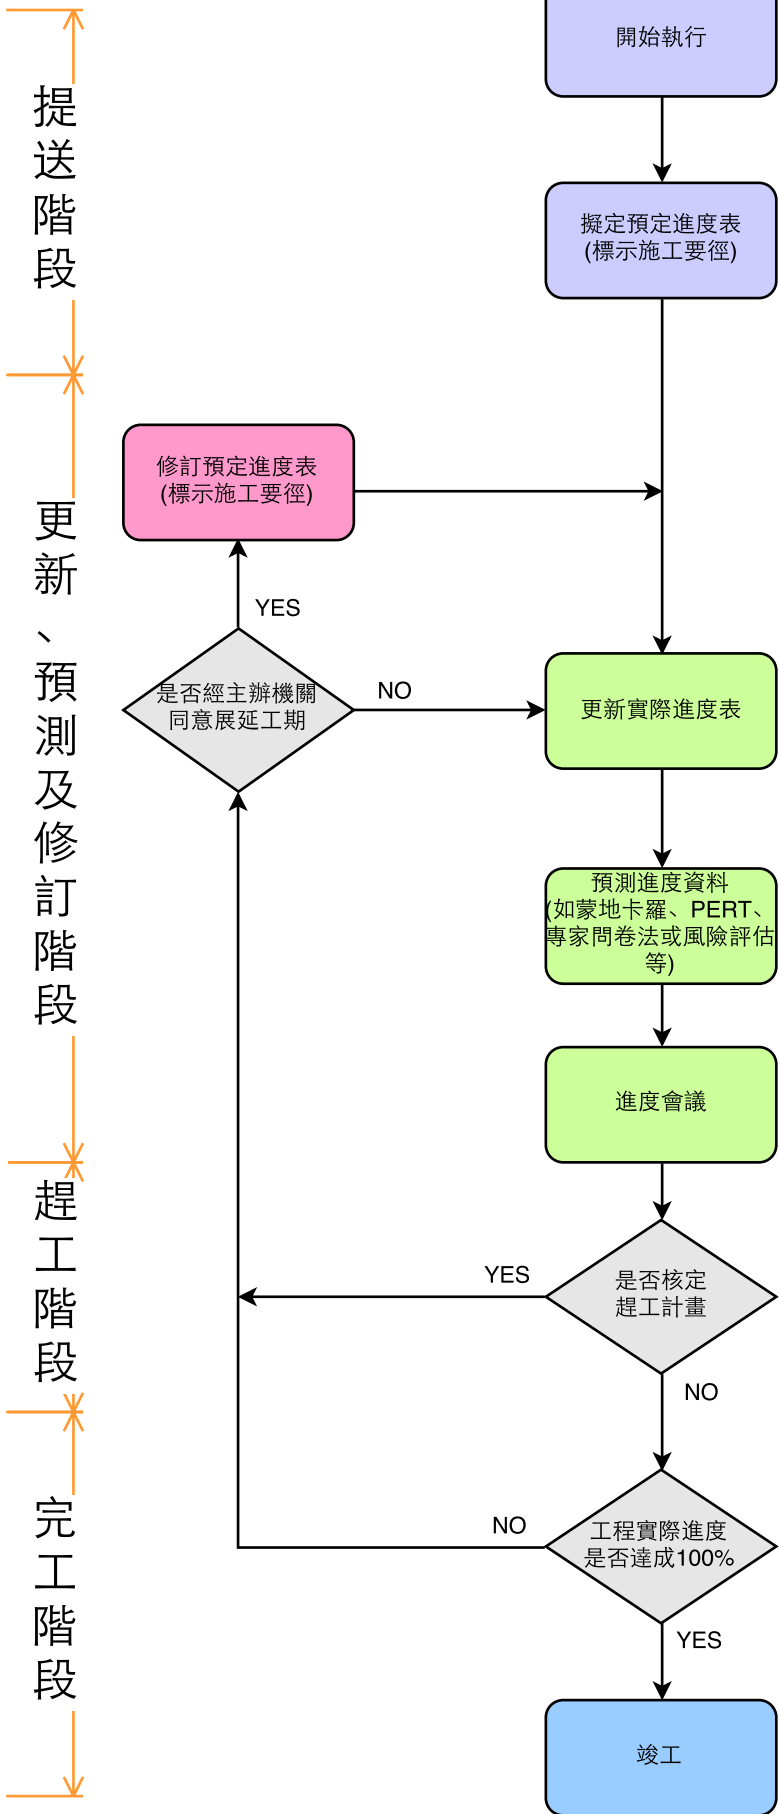

## 執行依據及參考規範

- 1. 工程採購契約範本：9(四)1.、3.、9(廿五)、[附錄3] 3.3.5 (10)、10(三)3.
  - 2. 統包工程採購契約範本：9(八)1.、3.、10(三)3.
  - 3. 公共工程技術服務契約範本：2 [附件一] 二(三)(3)、3 [附件二] 二(三)(3)
  - 4. 公共工程專案管理契約範本：2 [附件] 五、(二)、(六)
  - 5. 公共工程施工階段契約約定權責分工表：工程開(施)工前2.
  - 6. 監造計畫製作綱要：第四章4.表4.1
  - 7. 施工綱要規範第01103章：3.2.1、3.2.2、3.2.5
- 
- 1. 工程採購契約範本：7(三)1.、9(廿五) [附錄3] 3.3.5 (7)
  - 2. 統包工程採購契約範本：7(三)1.、9(卅三) [附錄]3.3.5 (7)
  - 3. 公共工程技術服務契約範本：2 [附件一] 二(三)(3)、3 [附件二] 二(三)(3)
  - 4. 公共工程專案管理契約範本：8 六、(四)、(五)
  - 5. 公共工程施工階段契約約定權責分工表：工程施工階段19.
  - 6. 施工綱要規範第01103章：3.4
- 
- 1. 工程採購契約範本：5(一)2.(1) [公共工程估驗付款作業程序] 三、(一)6.、9(廿五) [附錄3] 3.3.5(4)(9)
  - 2. 統包工程採購契約範本：9(卅三) [附錄1] 3.3.5(4)、(9)
  - 3. 公共工程技術服務契約範本：2 [附件一] 二(三)(8)、3 [附件二] 二(三)(3)
  - 4. 公共工程專案管理契約範本：8 六、(四)、(五)
  - 5. 公共工程施工階段契約約定權責分工表：工程施工階段17.
  - 6. 施工綱要規範第01103章：3.3.2、3.3.3、3.3.4
- 
- 1. 工程採購契約範本：9(廿五) [附錄3] 3.3.5(8)
  - 2. 統包工程採購契約範本：9(卅三) [附錄1] 3.3.5(8)
  - 3. 公共工程技術服務契約範本：2 [附件一] 二(三)(3)、3 [附件二] 二(三)(3)
  - 4. 公共工程專案管理契約範本：8 六、(三)
  - 5. 公共工程施工階段契約約定權責分工表：工程施工階段17.
  - 6. 施工綱要規範第01103章：3.3.3
- 
- 1. 工程採購契約範本：9(廿五) [附錄3] 3.3
- 
- 1. 工程採購契約範本：5(一)4.(1)
  - 2. 公共工程技術服務契約範本：2 [附件一] 二(三)(3)、3 [附件二] 二(三)(3)
  - 3. 公共工程廠商延誤履約進度處理要點：五、
  - 4. 公共工程趕工實施要點：二、
  - 5. 施工綱要規範第01103章：3.3.5

↑ 提送階段

更新、預測及修訂階段

趕工階段

完工階段
